

# 田辺市庁舎 新築工事 かわら版

工事の状況 6F 躯体（型枠・鉄筋・コンクリート）、1F,2F,3F,4F 仕上工事が進捗中です。

建物工事進捗率：61%

## TOPIC

北面（国道側）の足場が取れて、外装仕上げが一部見えています。



## 特定建設工事共同企業体

工事の進捗状況等について、お知らせします。工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

田辺市 HP も更新中！



## 月間工程

## 新庁舎整備事業全体スケジュール

	R2(2020)年												R3(2021)年												R4(2022)年												R5(2023)年												R6(2024)年		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
R5.7 庁舎本体 6F 躯体工事 / 仕上工事 / 多目的ホール基礎	[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]		
R5.8 庁舎本体 RF 躯体工事 / 仕上工事 / 多目的ホール基礎	[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]		
R5.9 庁舎棟仕上工事 / 多目的ホール基礎・躯体 / 外構工事	[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]												[Progress]		
	立体駐車場・店舗												解体1期工事												解体2期工事												庁舎新築工事												[Progress]		

開庁


令和6年度

## POINT

## 設計コンセプト

## 5. 建築計画

## 5F 平面計画

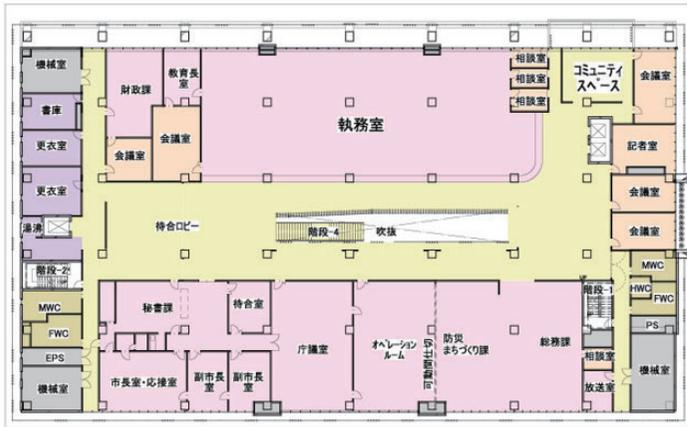

## 5 階（市長室、管理・教育部門）

- ・ 市長室、副市長室、教育長室を配置する。
- ・ オペレーションルームには、災害時に防災まちづくり課の執務室と一体となって使用できるように、可動間仕切壁を設ける。

※次号は「6F 平面計画」



田中組 Instagram も  
チェックしてね！

## 今月の工事の様子

庁舎棟躯体工事も終盤となり、今月から北側の多目的ホール棟の基礎工事を開始しました。



## 7/24 屋上のコンクリート打設状況

庁舎棟の屋根部分になる躯体コンクリートです。



北側ヤードで多目的ホール棟の  
掘削工事も進んでいます。



## 5F 進捗状況


型枠の解体中です。

5F の北側は  
柱が斜めになっています。



## 4F 進捗状況

サッシ・内装下地工事が  
進捗しています。

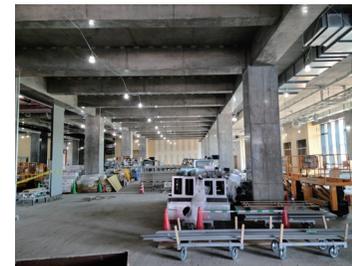

## 3F 進捗状況

内装下地・仕上工事が  
進捗しています。

3F は天井が高い為、  
他階より広く感じます。



## 2F 進捗状況

仕上工事も進んで、  
木造作仕上も進んでいます。

写真は照明用の木 BOX です。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、  
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
