

田辺市庁舎 新築工事 かわら版

工事の状況 庁舎棟躯体工事が完了し各階仕上工事、多目的ホール基礎工事が進捗中です。

建物工事進捗率：66%

TOPIC

多目的ホールの基礎も進捗しています。
現在、鉄筋工事中です。



特定建設工事共同企業体

工事の進捗状況等について、お知らせします。工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。


田辺市 HP も
更新中!



月間工程

新庁舎整備事業全体スケジュール

- R5.8 庁舎本体 RF 躯体工事 / 仕上工事 / 多目的ホール基礎
- R5.9 庁舎棟仕上工事 / 多目的ホール基礎・躯体 / 外構工事
- R5.10 庁舎棟仕上工事 / 多目的ホール躯体 / 外構工事

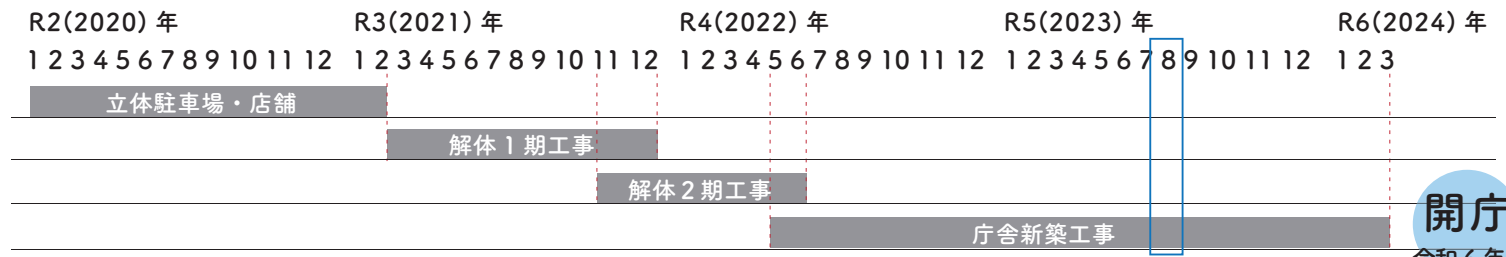


開庁
令和6年度

POINT

設計コンセプト

5. 建築計画

6F 平面計画

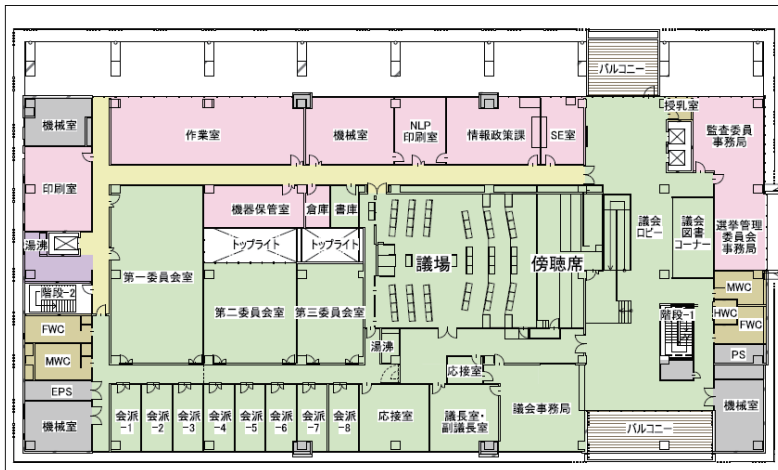

6階（議会・行政委員会等）

- ・ 全員協議会が開催できる委員会室を含め、常任委員会が同時開催できるよう、委員会室を3室設ける。
- ・ 議会ロビーとつながる海見える南側と、山見える北側に眺望のよいバルコニーを設ける。
- ・ 授乳室を設置する。

※次号は「立面計画」



田中組 Instagram も
チェックしてね！

今月の工事の様子

8月は庁舎棟の躯体が上棟し、多目的ホール棟工事も順調に進捗中です。
120tクレーンも解体・搬出を完了しました。




8/18 屋上コンクリート打設状況
←左図の議場部分の屋根です。上棟完了



8/21 にクレーンを解体して、搬出しました。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

＜プレストレストコンクリート工法の紹介＞



議場屋根部分は上図のように、コンクリート梁の中に埋め込んだPC鋼線を引張って固定する「プレストレストコンクリート工法」を採用することで広いスパンを作っています。



コンクリート打設後のPC鋼線です。



この機械により、PC鋼線を引張り、固定すると、圧縮力が加わります。
