

田辺市庁舎 新築工事 かわら版

工事の状況 庁舎棟各階仕上工事、多目的ホール躯体工事、外構が進捗中です。

建物工事進捗率：77%

TOPIC

多目的ホール躯体の型枠・鉄筋工事が進捗中です。来月初旬に1F躯体コンクリート打設予定です。



型枠が完了し、鉄筋工事中です。



特定建設工事共同企業体

工事の進捗状況等について、お知らせします。工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

田辺市 HP も
更新中！



月間工程

新庁舎整備事業全体スケジュール

- R5.10 庁舎棟 仕上工事 / 多目的ホール躯体 / 外構工事
- R5.11 庁舎棟仕上工事 / 多目的ホール躯体 / 外構工事
- R5.12 庁舎棟仕上工事 / 多目的ホール仕上 / 外構工事



開庁

令和6年度

POINT

設計コンセプト

5. 建築計画

立面計画（東・西）



- ・ 機能性を重視したシンプルな外観とする。
- ・ 紀州材を活用した、木のぬくもりが感じられる庁舎とする。
- ・ 軒庇は日射抑制にも有効であり夏場の日射を抑え冬場の日射を柔らかく導き、またメンテナンスバルコニーとしても活用する。
- ・ 5階、6階をセットバックさせて、圧迫感を軽減する。
- ・ 木格子を5本1組とすることにより、5市町村の合併を表現するとともに、熊野古道の林立する木々を連想させる。
- ・ 屋上部分に太陽光を利用したイルミネーションを設置し、災害時の灯台的役割を果たす。


※次号は「各室計画の交流モール計画」

今月の工事の様子

10月21日から庁舎棟外部足場の解体工事を行い、現在西面は解体が完了しました。また、立体駐車場との連絡通路となる歩道橋の続きも進捗中です。



足場解体後の西面の外観です。

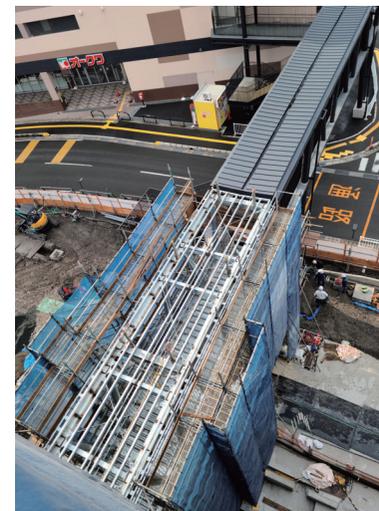

連絡通路上部から撮影

立体駐車場から連絡通路を通して、庁舎4Fへアクセス出来ます。

屋上トップライトです。

吹抜けになっており、5Fロビーまで、明かりが入ります。



西側上空からの屋上

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



田中組 Instagram も
チェックしてね！
